


# बुन्देलखण्ड पैकेज

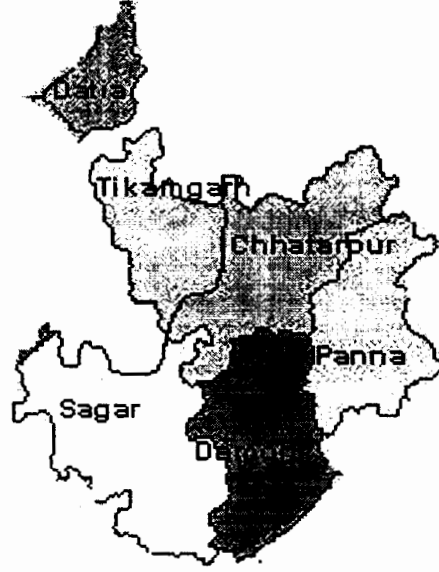

विद्युत/डीजल पम्प सेट प्रदाय एवं स्टाप डेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

माह फरवरी 2016

## बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण (ACA मद)

कपिल धारा कूओं पर विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय

विवरण	प्रथम चरण	द्वितीय चरण (2013-14 से 2016-17 तक)
कुल प्रावधानित राशि	रु. 80.00 करोड़	रु. 25.00 करोड़
कुल प्राप्त राशि	रु. 80.00 करोड़	रु. 4.15 करोड़
जिलों को प्रदाय राशि	रु. 80.00 करोड़	रु. 4.15 करोड़
व्यय राशि	रु. 77.75 करोड़	रु. 6.37 करोड़
भौतिक लक्ष्य संख्या	40,000	10,000
पम्पसेट प्रदाय हेतु चिन्हित हितग्राहियों की संख्या	39,308	3482
पम्पसेट प्रदाय हेतु जारी कार्यादेश की संख्या	39,308	3427
कुल स्थापित पम्पों की संख्या	38,737	2473

नदी नालों पर श्रंखलाबद्ध स्टाप डेम- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

- ✓ कुल प्रावधानित राशि रु. 130 करोड़
- ✓ जिलों को प्रदाय राशि रु 130 करोड़
- ✓ स्वीकृत स्टाप डेम की संख्या - 353
- ✓ पूर्ण स्टाप डेम की संख्या - 343
- ✓ प्रगतिरत स्टाप डेम की संख्या-07 ( 01 फाऊंडेशन लेवल एवं 06 सुपर स्ट्रकचर लेवल )
- ✓ निरस्त स्टाप डेम की संख्या- 03 ( टीकमगढ जिले के 02 एवं दतिया जिले का 01 स्टापडेम निरस्त किये जा चुके है)
- ✓ कुल व्यय राशि रु. 111.92 करोड़

## प्रथम चरण

पम्पसेट प्रदाय एवं स्टापडेम निर्माण की अद्यतन वित्तीय प्रगति (राशि करोड में)

क्र.	विवरण	स्वीकृत राशि	ACA से प्राप्त			जिलों को प्रदाय राशि	व्यय	प्रतिशत	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
			I	II	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पम्प सेट प्रदाय	80.00	45.00	35.00	80.00	80.00	77.75	97 %	76.01
2	स्टापडेम निर्माण	130.00	26.40	103.60	130.00	130.00	111.92	86%	103.77
	<b>योग</b>	<b>210.00</b>	<b>71.40</b>	<b>138.60</b>	<b>210.00</b>	<b>210.00</b>	<b>189.67</b>	<b>90%</b>	<b>179.78</b>

## द्वितीय चरण

पम्पसेट प्रदाय की अद्यतन वित्तीय प्रगति (राशि करोड में)

क्र.	विवरण	स्वीकृत राशि	ACA से प्राप्त राशि			जिलों को प्रदाय राशि	व्यय	प्रतिशत	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
			I	II	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पम्प सेट प्रदाय	25.00	4.15	0	4.15	4.15	6.37	153%	4.49

टीप :- द्वितीय चरण हेतु केवल रू. 4.15 करोड़ प्राप्त हुये हैं। शेष राशि बुन्देलखण्ड पैकेज मद में प्राप्त ब्याज की राशि से व्यय किया गया है।

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत

ACA मद से

पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (प्रथम चरण)

माह फरवरी 2016 की स्थिति में

प्रपत्र 01

क्रमांक	जिले का नाम	भौतिक प्रगति					वित्तीय प्रगति			
		भौतिक लक्ष्य	चिंहित हितग्राही	पम्प प्रतिस्थापना हेतु जारी आदेश (हितग्राहियों की संख्या)	स्थापित पंपों की संख्या	लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पंपों की संख्या	वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़ में)	जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड़ में)	पम्प सेट हेतु विमुक्त अनुदान की राशि (रु.करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	सागर	6568	6568	6568	6568	0	13.1360	13.1360	13.1360	
2	छतरपुर	9081	9081	9081	9081	0	18.1620	18.1620	18.1345	
3	दमोह	8223	8223	8223	8223	0	16.4460	16.4460	16.3078	
4	टीकमगढ़	8754	8062	8062	8062	692	17.5080	17.5080	16.1240	
5	पन्ना	6974	6974	6974	6403	571	13.9480	13.9480	13.2664	
6	दतिया	400	400	400	400	0	0.8000	0.8000	0.7815	
योग		40000	39308	39308	38737	1263	80.0000	80.0000	77.7502	

नोट :- 1. प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति के उपरांत ही द्वितीय चरण हेतु पम्प सेट प्रदाय करने की कार्यवाही की जाना है।

2. दमोह, छतरपुर, सागर एवं दतिया जिलों में प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति उपरांत, द्वितीय चरण हेतु हितग्राही चिंहित करते हुए प्रथम किश्त भी जारी की गई है।

3. राज्य योजना आयोग से द्वितीय किश्त की राशि प्राप्त न होने से बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज मद के अंतर्गत जिले में उपलब्ध ब्याज की राशि से भुगतान किया जा रहा है।

प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत ACA मद से स्टापडेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (प्रथम चरण)

15 फरवरी 2016 की स्थिति में

प्रपत्र - 02

क्र.	जिला	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति							
		वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़)	जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड़)	व्यय राशि (रु.करोड़)	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अप्रारंभ कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्य		
										फाऊंडेशन लेवल	सुपर स्ट्रक्चर लेवल	योग
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सागर	40.17	40.17	33.29	84	84	3	81	0	0	3	3
2	छतरपुर	24.27	24.27	21.56	86	86	0	86	0	0	0	0
3	दमोह	18.55	18.55	17.09	53	53	0	53	0	0	0	0
4	टीकमगढ़	20.88	20.88	17.81	67	67	3	62	2	1	2	3
5	पन्ना	15.78	15.78	12.28	35	35	1	34	0	0	1	1
6	दतिया	10.35	10.35	9.89	28	28	0	27	1	0	0	0
	महायोग	130.00	130.00	111.92	353	353	7	343	3	1	6	7

ट - टीकमगढ़ जिले के 02 कार्य एवं दतिया जिले के 01 कार्य निरस्त किये गये हैं। सागर जिले में 04 कार्य डूब क्षेत्र अंतर्गत हैं।

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत

ACA मद से

पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (द्वितीय चरण)

माह फरवरी 2016 की स्थिति में

प्रपत्र - 03

क्रमांक	जिले का नाम	भौतिक प्रगति					वित्तीय प्रगति		
		भौतिक लक्ष्य	चिह्नित हितग्राही	ऐसे हितग्राहियों की संख्या जिनके लिए प्रथम किस्त हेतु 60 % की राशि जारी की गई	स्थापित पंपों की संख्या	लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पंपों की संख्या	वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़ में)	जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड़ में)	पम्प सेट हेतु विमुक्त अनुदान की राशि (रु.करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सागर	1417	1417	1406	1047	370	3.5425	1.5450	1.9305
2	छतरपुर	2820	1327	1327	1114	1706	7.0500	1.8025	3.1714
3	दमोह	1906	663	663	312	1594	4.7650	0.7500	1.2245
4	टीकमगढ़	1939	0	0	0	1939	4.8475	0.0000	0.0000
5	पन्ना	1618	0	0	0	1618	4.0450	0.0000	0.0000
6	दतिया	300	75	31	0	300	0.7500	0.0525	0.0452
योग		10000	3482	3427	2473	7527	25.0000	4.1500	6.3716

नोट :- 1. प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति के उपरांत ही द्वितीय चरण हेतु पम्प सेट प्रदाय करने की कार्यवाही की जाना है।

2. दमोह, छतरपुर, सागर एवं दतिया जिलों में प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति उपरांत, द्वितीय चरण हेतु हितग्राही चिह्नित करते हुए प्रथम किस्त भी जारी की गई है।

3. टीकमगढ़ एवं पन्ना जिले में प्रथम चरण के लक्ष्य की पूर्ति न होने के कारण द्वितीय चरण की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है।

3. राज्य योजना आयोग से द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त न होने से बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज मद के अंतर्गत जिले में उपलब्ध ब्याज की राशि से भुगतान किया जा रहा है।

## MGNREGS अंतर्गत सम्पन्न कार्य (प्रथम चरण)

1 फरवरी 2016 की स्थिति में

प्रपत्र -04

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत कार्यों का विवरण			पूर्ण कार्यों का विवरण					
		कुँआ	खेत तालाब	जल संवर्द्धन के कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या			पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि (करोड़ में)		
					कुँआ	खेत तालाब	जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पुर्नजीवन, पुर्नभरण इत्यादि जैसे - लघु तालाब व माईनर नहरों का रखरखाव, जल पुनर्भरण, तालाबों का गहरीकरण व जीर्णोद्धार (गाद निकालने सहित)।	कुँआ	खेत तालाब	जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पुर्नजीवन, पुर्नभरण इत्यादि जैसे - लघु तालाब व माईनर नहरों का रखरखाव, जल पुनर्भरण, तालाबों का गहरीकरण व जीर्णोद्धार (गाद निकालने सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सागर	10049	992	842	8355	472	641	172.19	2.32	6.23
2	छतरपुर	14783	2427	210	11752	748	170	206.15	1.72	10.50
3	दमोह	10942	566	1098	9209	554	816	145.34	5.26	32.31
4	टीकमगढ़	9434	877	525	8110	872	466	127.76	1.30	12.18
5	पन्ना	8201	0	710	7479	0	384	120.63	0.00	14.12
6	दतिया	1220	0	225	546	0	82	5.44	0.00	0.23
<b>महायोग</b>		<b>53727</b>	<b>4862</b>	<b>3610</b>	<b>45451</b>	<b>2646</b>	<b>2559</b>	<b>777.52</b>	<b>10.60</b>	<b>75.57</b>
कुल व्यय राशि (करोड़ में)									<b>863.69</b>	

**बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज अंतर्गत व्यय का विवरण पम्पसेट एवं स्टापडेम (प्रथम चरण)**

माह फरवरी 2016 की स्थिति में

क्रमांक	जिले का नाम	वित्तीय लक्ष्य (रु. करोड़ में)			जिले को प्रदाय राशि (रु. करोड़ में)			व्यय राशि (रु. करोड़ में)			लक्ष्य v/s व्यय का प्रतिशत		
		पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सागर	13.14	40.17	53.31	13.14	40.17	53.31	13.14	33.29	46.43	100%	83%	87%
2	छतरपुर	18.16	24.27	42.43	18.16	24.27	42.43	18.13	21.56	39.69	100%	89%	94%
3	दमोह	16.45	18.55	35.00	16.45	18.55	35.00	16.31	17.09	33.40	99%	92%	95%
4	टीकमगढ़	17.51	20.88	38.39	17.51	20.88	38.39	16.12	17.81	33.93	92%	85%	88%
5	पन्ना	13.95	15.78	29.73	13.95	15.78	29.73	13.27	12.28	25.55	95%	78%	86%
6	दतिया	0.80	10.35	11.15	0.80	10.35	11.15	0.78	9.89	10.67	98%	96%	96%
<b>योग</b>		<b>80.00</b>	<b>130.00</b>	<b>210.00</b>	<b>80.00</b>	<b>130.00</b>	<b>210.00</b>	<b>77.75</b>	<b>111.92</b>	<b>189.67</b>	<b>97%</b>	<b>86%</b>	<b>90%</b>

क्र.	आबंटन	जारी राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1.	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्राप्त कुल राशि	210.000	189.67	90%
2.	राज्य सरकार की ओर से जारी राशि	0	-	-
	<b>कुल प्रदाय राशि</b>	<b>210.000</b>	<b>189.67</b>	<b>90%</b>



## Bundelkhand special package financial progress up to February 2016

Name of Department

<b>Rural Development</b>
--------------------------

### phase I, 2012-13

Sl.no.	Name of project/scheme	Total Project cost	Approved ACA	Allocation	Released Up to February 2016	Expenditure till February 2016	% of Expenditure	UC sent to GoI till February 2016
1	<b>Stop dam</b>	130	130	130	130	111.92	86%	103.77
2	Supply of Pump sets	80.00	80.00	80.00	80.00	77.75	97%	76.01

### phase I, 2013-14

Sl.no.	Name of project/scheme	Total Project cost	Approved ACA	Allocation	Released Up to February 2016	Expenditure till February 2016	% of Expenditure	UC sent to GoI till February 2016
1	-	-	-	-	-	-	-	-

### phase II, 2013-14

Sl.no.	Name of project/scheme	Total Project cost	Approved ACA	Allocation	Released Up to February 2016	Expenditure till February 2016	% of Expenditure	UC sent to GoI till February 2016
1	Supply of Pump sets	25.00	25.00	25.00	4.15	6.37	153%	4.49

<b>ACA- <u>Phase -1</u> 2012-13</b>			
<b>(As on 29.02. 2016) (Rs. In Cr.)</b>			
<b>Department</b>	<b>Allocation</b>	<b>Released</b>	<b>Expenditure</b>
<b>Rural development (Stop dam &amp; pump set )</b>	<b>210.00</b>	<b>210.00</b>	<b>189.67</b>
<b>ACA- <u>Phase -I</u> 2013-14</b>			
<b>(As on 29.02. 2016) (Rs. In Cr.)</b>			
<b>Department</b>	<b>Allocation</b>	<b>Released</b>	<b>Expenditure</b>
<b>Rural development</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ACA- <u>Phase -II</u> 2014-15</b>			
<b>(As on 29.02. 2016) (Rs. In Cr.)</b>			
<b>Department</b>	<b>Allocation</b>	<b>Released</b>	<b>Expenditure</b>
<b>Rural development (Stop dam &amp; pump set )</b>	<b>25</b>	<b>4.15</b>	<b>6.37</b>

**Financial & Physical Targets and Achievement as on February 2016 (MGNREGA)  
(Second phase)**

S.No.	Scheme/District	Financial (Rs. In Cr.)		Physical (No.)	
		Target	Actual	Target	Achievement
<b>II</b>	<b>Pump Sets / Lifting Device</b>				
1	Sagar	3.54	1.93	1417	1047
2	Chhatarpur	7.05	3.17	2820	1114
3	Damoh	4.77	1.22	1906	312
4	Tikamgarh	4.85	0.00	1939	0
5	Panna	4.05	0.00	1618	0
6	Datia	0.75	0.05	300	0
	<b>Total</b>	<b>25.00</b>	<b>6.37</b>	<b>10000</b>	<b>2473</b>

**Financial & Physical Targets and Achievement as on February 2016 (MGNREGA)  
(First phase)**

S.No.	Scheme/District	Financial (Rs. In Cr.)		Physical (No.)	
		Target	Actual	Target	Achievement
<b>I</b>	<b>Stop Dam</b>				
1	Sagar	40.17	33.29	84	81
2	Chhatarpur	24.27	21.56	86	86
3	Damoh	18.55	17.09	53	53
4	Tikamgarh	20.88	17.81	67	62
5	Panna	15.78	12.28	35	34
6	Datia	10.35	9.89	28	27
<b>Total</b>		<b>130.00</b>	<b>111.92</b>	<b>353</b>	<b>343</b>
<b>II</b>	<b>Pump Sets / Lifting Device</b>				
1	Sagar	13.14	13.14	6568	6568
2	Chhatarpur	18.16	18.13	9081	9081
3	Damoh	16.45	16.31	8223	8223
4	Tikamgarh	17.51	16.12	8754	8062
5	Panna	13.95	13.27	6974	6403
6	Datia	0.80	0.78	400	400
<b>Total</b>		<b>80.00</b>	<b>77.75</b>	<b>40000</b>	<b>38737</b>
<b>III</b>	<b>Dug Wells</b>				
1	Sagar	209.81	172.19	10049	8355
2	Chhatarpur	264.9	206.15	14783	11752
3	Damoh	175.13	145.34	10942	9209
4	Tikamgarh	135.17	127.76	9434	8110
5	Panna	135.95	120.63	8201	7479
6	Datia	12.15	5.44	1220	546
<b>Total</b>		<b>933.11</b>	<b>777.52</b>	<b>53727</b>	<b>45451</b>
<b>IV</b>	<b>Khet Talab</b>				
1	Sagar	4.77	2.32	992	472
2	Chhatarpur	5.58	1.72	2427	748
3	Damoh	5.90	5.26	566	554
4	Tikamgarh	1.38	1.30	877	872
5	Panna	0	0.00	0	0
6	Datia	0	0.00	0	0
<b>Total</b>		<b>17.63</b>	<b>10.60</b>	<b>4862</b>	<b>2646</b>
<b>V</b>	<b>Renovation and Recharging of Dug Wells</b>				
1	Sagar	8.20	6.23	842	641
2	Chhatarpur	12.98	10.50	210	170
3	Damoh	43.48	32.31	1098	816
4	Tikamgarh	13.72	12.18	525	466
5	Panna	26.10	14.12	710	384
6	Datia	0.63	0.23	225	82
<b>Total</b>		<b>105.11</b>	<b>75.57</b>	<b>3610</b>	<b>2559</b>

**PHYSICAL TARGETS & ACHIVEMENT UNDER BUNDELKHAND SPECIAL PACKAGE AS  
ON February 2016 (MGNREGA)**

<b>STOP DAM (FIRST PHASE)</b>					
<b>S.No.</b>	<b>Scheme/District</b>	<b>Target</b>	<b>Completed</b>	<b>Ongoing</b>	<b>Remark</b>
1	Sagar	84	81	3	
2	Chhatarpur	86	86	0	
3	Damoh	53	53	0	
4	Tikamgarh	67	62	3	02 Stop dams cancelled
5	Panna	35	34	1	
6	Datia	28	27	0	01 Stop dam cancelled
	<b>Total</b>	<b>353</b>	<b>343</b>	<b>7</b>	
<b>PUMP SETS / LIFTING DEVICE (FIRST PHASE)</b>					
<b>S.No.</b>	<b>Scheme/District</b>	<b>Target</b>	<b>IDENTIFIED BENIFICIERIS</b>	<b>PUMP INSTALLED</b>	<b>Remark</b>
1	Sagar	6568	6568	6568	
2	Chhatarpur	9081	9081	9081	
3	Damoh	8223	8223	8223	
4	Tikamgarh	8754	8062	8062	
5	Panna	6974	6974	6403	
6	Datia	400	400	400	
	<b>Total</b>	<b>40000</b>	<b>39308</b>	<b>38737</b>	
<b>PUMP SETS / LIFTING DEVICE (SECOND PHASE)</b>					
<b>S.No.</b>	<b>Scheme/District</b>	<b>Target</b>	<b>IDENTIFIED BENIFICIERIS</b>	<b>PUMP INSTALLED</b>	<b>Remark</b>
1	Sagar	1417	1417	1047	process of installing pump sets is on progress
2	Chhatarpur	2820	1327	1114	
3	Damoh	1906	663	312	
4	Tikamgarh	1939	0	0	
5	Panna	1618	0	0	
6	Datia	300	75	0	
	<b>Total</b>	<b>10000</b>	<b>3482</b>	<b>2473</b>	
