


# बुन्देलखण्ड पैकेज

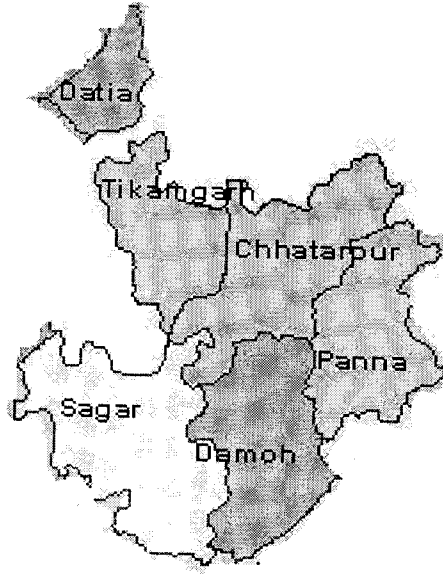

विद्युत/डीजल पम्प सेट प्रदाय एवं स्टाप डेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

माह जनवरी 2015

## बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण (ACA मद)

कपिल धारा कूओं पर विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय

विवरण	प्रथम चरण	द्वितीय चरण (2013-14 से 2016-17 तक)
कुल प्रावधानित राशि	रु. 80.00 करोड़	रु. 25.00 करोड़
कुल प्राप्त राशि	रु. 80.00 करोड़	रु. 4.15 करोड़
जिलों को प्रदाय राशि	रु. 80.00 करोड़	रु. 4.15 करोड़
भौतिक लक्ष्य संख्या	40,000	10,000
पम्पसेट प्रदाय हेतु चिन्हित हितग्राहियों की संख्या	39,322	2,266
पम्पसेट प्रदाय हेतु जारी कार्यादेश की संख्या	38,534	768
कुल स्थापित पम्पों की संख्या	37,216	0
अनुदान हेतु विमुक्त राशि (व्यय राशि)	रु. 72.70 करोड़	रु. 1.15 करोड़

नदी नालों पर श्रंखलाबद्ध स्टाप डेम- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

- ✓ कुल प्रावधानित राशि रु. 130 करोड़
- ✓ जिलों को प्रदाय राशि रु 130 करोड़
- ✓ स्टाप डेम की संख्या - 353
- ✓ पूर्ण स्टाप डेम की संख्या - 320
- ✓ प्रगतिरत स्टाप डेम की संख्या-31 ( 9 फाऊंडेशन लेवल एवं 22 सुपर स्ट्रक्चर लेवल )
- ✓ अप्रारंभ स्टाप डेम की संख्या- 02 ( टीकमगढ जिले के 02 अप्रारंभ स्टापडेम निरस्त किये जा चुके है)
- ✓ कुल व्यय राशि रु. 103.68 करोड़

## प्रथम चरण

पम्पसेट प्रदाय एवं स्टापडेम निर्माण की अद्यतन वित्तीय प्रगति (राशि करोड में)

क्र	विवरण	स्वीकृत राशि	ACA से प्राप्त			जिलों को प्रदाय राशि	व्यय	प्रतिशत	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
			I	II	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पम्प सेट प्रदाय	80.00	45.00	35.00	80.00	80.00	72.70	91%	66.77
2	स्टापडेम निर्माण	130.00	26.40	103.60	130.00	130.00	103.68	80%	94.34
	<b>योग</b>	<b>210.00</b>	<b>71.40</b>	<b>138.60</b>	<b>210.00</b>	<b>210.00</b>	<b>176.38</b>	<b>84%</b>	<b>161.11</b>

## द्वितीय चरण

पम्पसेट प्रदाय की अद्यतन वित्तीय प्रगति (राशि करोड में)

क्र	विवरण	स्वीकृत राशि	ACA से प्राप्त राशि			जिलों को प्रदाय राशि	व्यय	प्रतिशत	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
			I	II	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पम्प सेट प्रदाय	25.00	4.15	0	4.15	4.15	1.15	0%	0

**Financial & Physical Targets and Achievement as on January 2015 (MGNREGA)  
(First phase)**

S.No.	Scheme/District	Financial (Rs. In Cr.)		Physical (No.)	
		Target	Actual	Target	Achievement
<b>I</b>	<b>Stop Dam</b>				
1	Sagar	40.17	30.43	84	74
2	Chhatarpur	24.27	20.18	86	81
3	Damoh	18.55	16.68	53	53
4	Tikamgarh	20.88	15.90	67	60
5	Panna	15.78	11.93	35	30
6	Datia	10.35	8.56	28	22
	<b>Total</b>	<b>130.00</b>	<b>103.68</b>	<b>353</b>	<b>320</b>
<b>II</b>	<b>Pump Sets / Lifting Device</b>				
1	Sagar	13.14	12.12	6568	6528
2	Chhatarpur	18.16	17.52	9081	9081
3	Damoh	16.45	15.67	8223	8223
4	Tikamgarh	17.51	15.15	8754	7577
5	Panna	13.95	11.65	6974	5499
6	Datia	0.80	0.58	400	308
	<b>Total</b>	<b>80.00</b>	<b>72.70</b>	<b>40000</b>	<b>37216</b>
<b>III</b>	<b>Dug Wells</b>				
1	Sagar		160.32		7638
2	Chhatarpur		206.15		11453
3	Damoh		137.01		8677
4	Tikamgarh		124.66		7658
5	Panna		115.77		6722
6	Datia		5.24		518
	<b>Total</b>		<b>749.16</b>		<b>42666</b>
<b>IV</b>	<b>Khet Talab</b>				
1	Sagar		2.27	992	472
2	Chhatarpur		1.72	2427	748
3	Damoh		1.76	566	185
4	Tikamgarh		1.30	877	872
5	Panna		0.00	0	0
6	Datia		0.00	0	0
	<b>Total</b>		<b>7.05</b>	<b>4862</b>	<b>2277</b>
<b>V</b>	<b>Renovation and Recharging of Dug Wells</b>				
1	Sagar		6.21	842	641
2	Chhatarpur		10.50	210	170
3	Damoh		20.16	1098	509
4	Tikamgarh		12.18	525	466
5	Panna		14.12	710	384
6	Datia		0.23	225	82
	<b>Total</b>		<b>63.40</b>	<b>3610</b>	<b>2252</b>

<b>Financial &amp; Physical Targets and Achievement as on January 2015 (MGNREGA) (Second phase)</b>					
<b>S.No.</b>	<b>Scheme/District</b>	<b>Financial (Rs. In Cr.)</b>		<b>Physical (No.)</b>	
		<b>Target</b>	<b>Actual</b>	<b>Target</b>	<b>Achievement</b>
<b>II</b>	<b>Pump Sets / Lifting Device</b>				
1	Sagar	3.54	0.00	1417	0
2	Chhatarpur	7.05	1.05	2820	0
3	Damoh	4.77	0.10	1906	0
4	Tikamgarh	4.85	0.00	1939	0
5	Panna	4.05	0.00	1618	0
6	Datia	0.75	0.00	300	0
	<b>Total</b>	<b>25.00</b>	<b>1.15</b>	<b>10000</b>	<b>0</b>

**Note - 2266 beneficiaries are selected to provide pump-sets, out of which for 768 pump-sets first installment (60%) has been released.**

**बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत**  
**ACA मद से**  
**पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (प्रथम चरण)**

माह जनवरी 2015 की स्थिति में

प्रपत्र 01

क्रमांक	जिले का नाम	भौतिक प्रगति					वित्तीय प्रगति		
		भौतिक लक्ष्य	चिंहित हितग्राही	पम्प प्रतिस्थापना हेतु जारी आदेश (हितग्राहियों की संख्या)	स्थापित पंपों की संख्या	लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पंपों की संख्या	वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़ में)	जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड़ में)	पम्प सेट हेतु विमुक्त अनुदान की राशि (रु.करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सागर	6568	6568	6568	6528	40	13.14	13.1360	12.12
2	छतरपुर	9081	9081	9081	9081	0	18.16	18.1620	17.52
3	दमोह	8223	8223	8223	8223	0	16.45	16.4460	15.67
4	टीकमगढ़	8754	8354	7577	7577	1177	17.51	17.5080	15.15
5	पन्ना	6974	6696	6696	5499	1475	13.95	13.9480	11.65
6	दतिया	400	400	389	308	92	0.80	0.8000	0.58
योग		40000	39322	38534	37216	2784	80.0000	80.0000	72.70

नोट :- 1. प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति के उपरांत ही द्वितीय चरण हेतु पम्प सेट प्रदाय करने की कार्यवाही की जाना है।

2. दमोह एवं छतरपुर जिलों में प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति उपरांत, द्वितीय चरण हेतु हितग्राही चिंहित करते हुए प्रथम किश्त भी जारी की गई है 3. दतिया एवं सागर में प्रथम चरण के लक्ष्य अनुसार पम्प प्रदाय हेतु प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है अतः द्वितीय चरण हेतु हितग्राही भी चिंहित किये गये हैं।

4. टीकमगढ़ एवं पन्ना जिले में अभी प्रथम चरण हेतु निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है। अतः द्वितीय चरण हेतु पम्प प्रदाय किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकी है।

प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत ACA मद से स्टापडेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (प्रथम चरण)

साह जनवरी 2015 की स्थिति में

प्रपत्र - 02

क्र.	जिला	वित्तीय प्रगति			भौतिक प्रगति							
		वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़)	जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड़)	व्यय राशि (रु.करोड़)	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अप्रारंभ कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्य		
										फाऊंडेशन लेवल	सुपर स्ट्रक्चर लेवल	योग
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सागर	40.17	40.17	30.43	84	84	10	74	0	6	4	10
2	छतरपुर	24.27	24.27	20.18	86	86	5	81	0	0	5	5
3	दमोह	18.55	18.55	16.68	53	53	0	53	0	0	0	0
4	टीकमगढ़	20.88	20.88	15.90	67	67	5	60	2	1	4	5
5	पन्ना	15.78	15.78	11.93	35	35	5	30	0	0	5	5
6	दतिया	10.35	10.35	8.56	28	28	6	22	0	2	4	6
	महायोग	130.00	130.00	103.68	353	353	31	320	2	9	22	31

ट - टीकमगढ़ जिले के 02 कार्य निरस्त किये गये हैं। सागर जिले में 02 कार्य डूब क्षेत्र अंतर्गत हैं।

**बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत  
ACA मद से  
पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (द्वितीय चरण)**

माह जनवरी 2015 की स्थिति में

प्रपत्र - 03

क्रमांक	जिले का नाम	भौतिक प्रगति					वित्तीय प्रगति		
		भौतिक लक्ष्य	चिंहित हितग्राही	ऐसे हितग्राहियों की संख्या जिनके लिए प्रथम किश्त हेतु 60 % की राशि जारी की गई	स्थापित पंपों की संख्या	लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पंपों की संख्या	वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़ में)	जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड़ में)	पम्प सेट हेतु विमुक्त अनुदान की राशि (रु.करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सागर	1417	1070	0	0	1417	3.54	0.75	0.00
2	छतरपुर	2820	676	702	0	2820	7.05	1.09	1.05
3	दमोह	1906	454	66	0	1906	4.77	0.75	0.10
4	टीकमगढ़	1939	0	0	0	1939	4.85	0.80	0.00
5	पन्ना	1618	0	0	0	1618	4.05	0.71	0.00
6	दतिया	300	66	0	0	300	0.75	0.05	0.00
<b>योग</b>		10000	2266	768	0	10000	25.00	4.15	1.15

नोट :- 1. प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति के उपरांत ही द्वितीय चरण हेतु पम्प सेट प्रदाय करने की कार्यवाही की जाना है।

2. दमोह एवं छतरपुर जिलों में प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति उपरांत, द्वितीय चरण हेतु हितग्राही चिंहित करते हुए प्रथम किश्त भी जारी की गई है।

3. दतिया एवं सागर में प्रथम चरण के लक्ष्य अनुसार पम्प प्रदाय हेतु प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है अतः द्वितीय चरण हेतु हितग्राही भी चिंहित किये गये हैं।

4. टीकमगढ़ एवं पन्ना जिले में अभी प्रथम चरण हेतु निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है। अतः द्वितीय चरण हेतु पम्प प्रदाय किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकी है।



## MGNREGS अंतर्गत सम्पन्न कार्य (प्रथम चरण)

जनवरी 2015 की स्थिति में

प्रपत्र -04

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत कार्यों का विवरण			पूर्ण कार्यों का विवरण					
		कुँआ	खेत तालाब	जल संवर्द्धन के कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या			पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि (करोड़ में)		
					कुँआ	खेत तालाब	जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पुर्नजीवन, पुर्नभरण इत्यादि जैसे - लघु तालाब व माईनर नहरों का रखरखाव, जल पुनर्भरण, तालाबों का गहरीकरण व जीर्णोद्धार (गाद निकालने सहित)।	कुँआ	खेत तालाब	जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पुर्नजीवन, पुर्नभरण इत्यादि जैसे - लघु तालाब व माईनर नहरों का रखरखाव, जल पुनर्भरण, तालाबों का गहरीकरण व जीर्णोद्धार (गाद निकालने सहित)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	सागर	9996	992	842	7638	472	641	160.32	2.27	6.21
2	छतरपुर	14717	2427	210	11453	748	170	206.15	1.72	10.50
3	दमोह	13073	566	1098	8677	185	509	137.01	1.76	20.16
4	टीकमगढ़	8654	877	525	7658	872	466	124.66	1.30	12.18
5	पन्ना	8303	0	710	6722	0	384	115.77	0.00	14.12
6	दतिया	1220	0	225	518	0	82	5.24	0.00	0.23
<b>महायोग</b>		<b>55963</b>	<b>4862</b>	<b>3610</b>	<b>42666</b>	<b>2277</b>	<b>2252</b>	<b>749.16</b>	<b>7.05</b>	<b>63.40</b>
<b>कुल व्यय राशि (करोड़ में)</b>									<b>819.61</b>	

**बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज अंतर्गत व्यय का विवरण पम्पसेट एवं स्टापडेम (प्रथम चरण)**

माह जनवरी 2015 की स्थिति में

क्रमांक	जिले का नाम	वित्तीय लक्ष्य (रु. करोड़ में)			जिले को प्रदाय राशि (रु. करोड़ में)			व्यय राशि (रु. करोड़ में)			लक्ष्य v/s व्यय का प्रतिशत		
		पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सागर	13.14	40.17	53.31	13.14	40.17	53.31	12.12	30.43	42.55	92%	76%	80%
2	छतरपुर	18.16	24.27	42.43	18.16	24.27	42.43	17.52	20.18	37.70	96%	83%	89%
3	दमोह	16.45	18.55	35.00	16.45	18.55	35.00	15.67	16.68	32.35	95%	90%	92%
4	टीकमगढ़	17.51	20.88	38.39	17.51	20.88	38.39	15.15	15.90	31.05	87%	76%	81%
5	पन्ना	13.95	15.78	29.73	13.95	15.78	29.73	11.65	11.93	23.58	84%	76%	79%
6	दतिया	0.80	10.35	11.15	0.80	10.35	11.15	0.58	8.56	9.14	73%	83%	82%
<b>योग</b>		<b>80.00</b>	<b>130.00</b>	<b>210.00</b>	<b>80.00</b>	<b>130.00</b>	<b>210.00</b>	<b>72.70</b>	<b>103.68</b>	<b>176.38</b>	<b>91%</b>	<b>80%</b>	<b>84%</b>

क्र.	आबंटन	जारी राशि	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1.	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्राप्त कुल राशि	210.000	176.38	84%
2.	राज्य सरकार की ओर से जारी राशि	0	-	-
	<b>कुल प्रदाय राशि</b>	<b>210.000</b>	<b>176.38</b>	<b>84%</b>

**Allocation, Released and Expenditure of funds from ACA,CS/CSS, MGNREGA components to MP (As on 31.01. 2015) (Rs. In Cr.) I Phase**

S N.	Department	Approved Budget	Additional central Assistance			CS/CSS Schemes			MGNREGA			UC
			Allocation	Released	Actual	Allocation	Released	Actual	Allocation	Released	Actual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Rural development</b>											
i)	Supply of pump sets	80.00	80.00	80.00	72.70							66.77
ii)	Construction of Stop Dams	130.00	130.00	130.00	103.68							94.34
iii)	Construction of New Dug Wells	200.00							200.00	749.16	749.16	
iv)	Watershed Management	480.00				480.00	150.83	113.38				113.38
v)	Farm Ponds	90.00							90.00	7.05	7.05	
vi)	Renovation and Recharging of dug Wells	320.00							320.00	63.40	63.40	
	<b>Total</b>	<b>1300.00</b>	<b>210.00</b>	<b>210.00</b>	<b>176.38</b>	<b>480.00</b>	<b>150.83</b>	<b>113.38</b>	<b>610.00</b>	<b>819.61</b>	<b>819.61</b>	<b>274.49</b>

Note :- 1. In MGNREGA, no allotment is released for particular work, therefore actual expenditure has been assumed as released fund.  
2. Details of watershed management are, as per information given by Office of The Director RGM.

**Allocation, Released and Expenditure of funds from ACA,CS/CSS, MGNREGA  
components to MP (As on 31.01. 2015) (Rs. In Cr.) II Phase**

S N.	Department	Approved Budget	Additional central Assistance			CS/CSS Schemes			MGNREGA			UC
			Alloca tion	Relea sed	Actual	Allocation	Released	Actual	Allocation	Released	Actual	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Rural development</b>											
i)	Supply of pump sets	25.00	25.00	4.15	1.15							
	<b>Total</b>	<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	<b>4.15</b>	<b>1.15</b>							
