


# बुन्देलखण्ड पैकेज

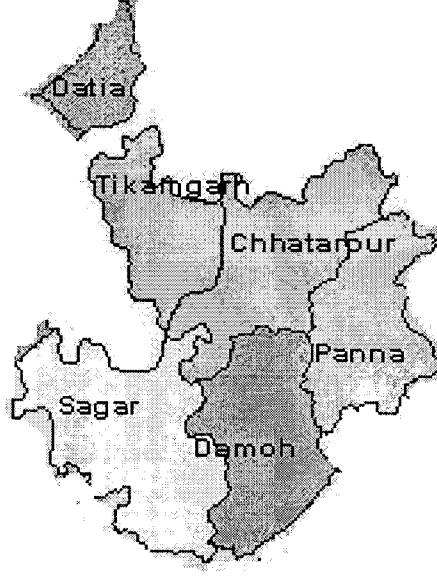

*विद्युत/डीजल पम्प सेट प्रदाय एवं स्टाप डेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति*

**माह जून 2015**

## बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण (ACA मद)

### कपिल धारा कूओं पर विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय

विवरण	प्रथम चरण	द्वितीय चरण (2013-14 से 2016-17 तक)
कुल प्रावधानित राशि	रु. 80.00 करोड़	रु. 25.00 करोड़
कुल प्राप्त राशि	रु. 80.00 करोड़	रु. 4.15 करोड़
जिलों को प्रदाय राशि	रु. 80.00 करोड़	रु. 4.15 करोड़
व्यय राशि	रु. 75.79 करोड़	रु. 5.03 करोड़
भौतिक लक्ष्य संख्या	40,000	10,000
पम्पसेट प्रदाय हेतु चिन्हित हितग्राहियों की संख्या	38,885	3123
पम्पसेट प्रदाय हेतु जारी कार्यादेश की संख्या	38,870	3033
कुल स्थापित पम्पों की संख्या	38175	1539

### नदी नालों पर श्रंखलाबद्ध स्टाप डेम- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

- ✓ कुल प्रावधानित राशि रु. 130 करोड़
- ✓ जिलों को प्रदाय राशि रु 130 करोड़
- ✓ स्वीकृत स्टाप डेम की संख्या – 353
- ✓ पूर्ण स्टाप डेम की संख्या – 332
- ✓ प्रगतिरत स्टाप डेम की संख्या-18 ( 4 फाऊंडेशन लेवल एवं 14 सुपर स्ट्रकचर लेवल )
- ✓ निरस्त स्टाप डेम की संख्या- 03 ( टीकमगढ जिले के 02 एवं दतिया जिले का 01 स्टापडेम निरस्त जा चुके हैं)
- ✓ कुल व्यय राशि रु. 106.77करोड़

## प्रथम चरण

पम्पसेट प्रदाय एवं स्टापडेम निर्माण की अद्यतन वित्तीय प्रगति (राशि करोड में)

क्र	विवरण	स्वीकृत राशि	ACA से प्राप्त			जिलों को प्रदाय राशि	व्यय	प्रतिशत	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
			I	II	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पम्प सेट प्रदाय	80.00	45.00	35.00	80.00	80.00	75.79	95 %	73.27
2	स्टापडेम निर्माण	130.00	26.40	103.60	130.00	130.00	106.77	82%	101.28
	<b>योग</b>	<b>210.00</b>	<b>71.40</b>	<b>138.60</b>	<b>210.00</b>	<b>210.00</b>	<b>182.56</b>	<b>87%</b>	<b>174.55</b>

## द्वितीय चरण

पम्पसेट प्रदाय की अद्यतन वित्तीय प्रगति (राशि करोड में)

क्र	विवरण	स्वीकृत राशि	ACA से प्राप्त राशि			जिलों को प्रदाय राशि	व्यय	प्रतिशत	उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
			I	II	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पम्प सेट प्रदाय	25.00	4.15	0	4.15	4.15	5.03	121 %	4.15

टीप :- द्वितीय चरण हेतु केवल रू. 4.15 करोड़ प्राप्त हुये हैं। शेष राशि बुन्देलखण्ड पैकेज मद में प्राप्त ब्याज की राशि से व्यय किया गया है।

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत

ACA मद से

पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (प्रथम चरण)

माह जून 2015 की स्थिति में

प्रपत्र 01

क्रमांक	जिले का नाम	भौतिक प्रगति					वित्तीय प्रगति			
		भौतिक लक्ष्य	चिह्नित हितग्राही	पम्प प्रतिस्थापना हेतु जारी आदेश (हितग्राहियों की संख्या)	स्थापित पंपों की संख्या	लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पंपों की संख्या	वित्तीय लक्ष्य (रु. करोड़ में)	जिले को प्रदाय राशि (रु. करोड़ में)	पम्प सेट हेतु विमुक्त अनुदान की राशि (रु. करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	सागर	6568	6568	6568	6568	0	13.1360	13.1360	13.1360	
2	छतरपुर	9081	9081	9081	9081	0	18.1620	18.1620	17.9323	
3	दमोह	8223	8223	8223	8223	0	16.4460	16.4460	16.1490	
4	टीकमगढ़	8754	7915	7900	7900	854	17.5080	17.5080	15.8080	
5	पन्ना	6974	6698	6698	6003	971	13.9480	13.9480	12.0275	
6	दतिया	400	400	400	400	0	0.8000	0.8000	0.7345	
	योग	40000	38885	38870	38175	1825	80.0000	80.0000	75.7873	

नोट :-

1. प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति के उपरांत ही द्वितीय चरण हेतु पम्प सेट प्रदाय करने की कार्यवाही की जाना है।
2. दमोह, छतरपुर, एवं सागर जिलों में प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति उपरांत, द्वितीय चरण हेतु हितग्राही विहित करते हुए प्रथम किस्त भी जारी की गई है।
3. दतिया में प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति उपरांत, द्वितीय चरण हेतु हितग्राही भी चिह्नित किये गये हैं।
4. टीकमगढ़ एवं पन्ना जिले में अभी प्रथम चरण हेतु निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई है। अतः द्वितीय चरण हेतु पम्प प्रदाय किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकी है।

**प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल**  
**बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत ACA मद से स्टापडेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (प्रथम चरण)**

माह जून 2015 की स्थिति में

प्रपत्र - 02

क्र.	जिला	वित्तीय प्रगति				भौतिक प्रगति						
		वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़)	जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड़)	व्यय राशि (रु.करोड़)	भौतिक लक्ष्य	स्वीकृत कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अप्रारंभ कार्यों की संख्या	प्रगतिरत कार्य		
										फाऊंडेशन लेवल	सुपर स्ट्रक्चर लेवल	योग
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सागर	40.17	40.17	31.92	84	84	7	77	0	2	5	7
2	छतरपुर	24.27	24.27	20.96	86	86	2	84	0	0	2	2
3	दमोह	18.55	18.55	16.91	53	53	0	53	0	0	0	0
4	टीकमगढ़	20.88	20.88	15.97	67	67	5	60	2	1	4	5
5	पन्ना	15.78	15.78	12.10	35	35	1	34	0	0	1	1
6	दतिया	10.35	10.35	8.91	28	28	3	24	1	1	2	3
	महायोग	130.00	130.00	106.77	353	353	18	332	3	4	14	18

नोट - टीकमगढ़ जिले के 02 कार्य एवं दतिया जिले के 01 कार्य निरस्त किये गये हैं। सागर जिले में 02 कार्य डूब क्षेत्र अंतर्गत हैं।

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत

ACA मद से

पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (द्वितीय चरण)

माह जून 2015 की स्थिति में

प्रपत्र - 03

क्रमांक	जिले का नाम	भौतिक प्रगति					वित्तीय प्रगति			
		भौतिक लक्ष्य	चिह्नित हितग्राही	ऐसे हितग्राहियों की संख्या जिनके लिए प्रथम किस्त हेतु 60 % की राशि जारी की गई	स्थापित पंपों की संख्या	लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पंपों की संख्या	वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़ में)	जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड़ में)	पम्प सेट हेतु विमुक्त अनुदान की राशि (रु.करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	सागर	1417	1339	1339	563	854	3.5425	1.5450	1.5450	
2	छतरपुर	2820	1188	1188	916	1904	7.0500	1.8025	2.6712	
3	दमोह	1906	530	506	60	1846	4.7650	0.7500	0.8177	
4	टीकमगढ़	1939	0	0	0	1939	4.8475	0.0000	0.0000	
5	पन्ना	1618	0	0	0	1618	4.0450	0.0000	0.0000	
6	दतिया	300	66	0	0	300	0.7500	0.0525	0.0000	
	योग	10000	3123	3033	1539	8461	25.0000	4.1500	5.0339	

नोट :- 1. प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति के उपरांत ही द्वितीय चरण हेतु पम्प सेट प्रदाय करने की कार्यवाही की जाना है।

2. दमोह, छतरपुर एवं सागर जिलों में प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति उपरांत, द्वितीय चरण हेतु हितग्राही चिह्नित करते हुए प्रथम किस्त भी जारी की गई है।

3. दतिया में प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति उपरांत, द्वितीय चरण हेतु हितग्राही भी चिह्नित किये गये हैं।

## MGNREGS अंतर्गत सम्पन्न कार्य (प्रथम चरण)

माह जून 2015 की स्थिति में

प्रपत्र -04

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत कार्यों का विवरण			पूर्ण कार्यों का विवरण					
		कुँआ	खेत तालाब	जल संवर्द्धन के कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या			पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि (करोड़ में)		
					कुँआ	खेत तालाब	जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पुनर्जीवन, पुनर्भरण इत्यादि जैसे - लघु तालाब व माईनर नहरों का रखरखाव, जल पुनर्भरण, तालाबों का गहरीकरण व जीर्णोद्धार (गाद निकालने सहित)।	कुँआ	खेत तालाब	जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पुनर्जीवन, पुनर्भरण इत्यादि जैसे - लघु तालाब व माईनर नहरों का रखरखाव, जल पुनर्भरण, तालाबों का गहरीकरण व जीर्णोद्धार (गाद निकालने सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सागर	9996	992	842	7779	472	641	163.28	2.27	6.21
2	छतरपुर	14717	2427	210	11453	748	170	206.15	1.72	10.50
3	दमोह	10942	566	1098	8758	554	816	139.66	5.26	32.31
4	टीकमगढ़	8651	877	525	7978	872	466	124.66	1.30	12.18
5	पन्ना	8201	0	710	7172	0	384	118.90	0.00	14.12
6	दतिया	1220	0	225	546	0	82	5.44	0.00	0.23
<b>महायोग</b>		<b>53727</b>	<b>4862</b>	<b>3610</b>	<b>43686</b>	<b>2646</b>	<b>2559</b>	<b>758.11</b>	<b>10.56</b>	<b>75.55</b>
कुल व्यय राशि (करोड़ में)										<b>844.22</b>

**बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज अंतर्गत व्यय का विवरण पम्पसेट एवं स्टापडेम (प्रथम चरण)**

माह जून 2015 की स्थिति में

क्रमांक	जिले का नाम	वित्तीय लक्ष्य (रु. करोड़ में)			जिले को प्रदाय राशि (रु. करोड़ में)			व्यय राशि (रु. करोड़ में)			लक्ष्य v/s व्यय का प्रतिशत		
		पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग	पम्पसेट	स्टापडेम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सागर	13.14	40.17	53.31	13.14	40.17	53.31	13.14	31.92	45.06	100%	79%	85%
2	छतरपुर	18.16	24.27	42.43	18.16	24.27	42.43	17.93	20.96	38.89	99%	86%	92%
3	दमोह	16.45	18.55	35.00	16.45	18.55	35.00	16.15	16.91	33.06	98%	91%	94%
4	टीकमगढ़	17.51	20.88	38.39	17.51	20.88	38.39	15.81	15.97	31.78	90%	76%	83%
5	पन्ना	13.95	15.78	29.73	13.95	15.78	29.73	12.03	12.10	24.13	86%	77%	81%
6	दतिया	0.80	10.35	11.15	0.80	10.35	11.15	0.73	8.91	9.64	92%	86%	86%
	योग	80.00	130.00	210.00	80.00	130.00	210.00	75.79	106.77	182.56	95%	82%	87%

क्र.	आबंटन	जारी राशि		व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
		जारी राशि	व्यय राशि		
1.	अतिरिक्त केंद्रीय सहायता से प्राप्त कुल राशि	210.000	182.56	87%	
2.	राज्य सरकार की ओर से जारी राशि	0	-	-	
	कुल प्रदाय राशि	210.000	182.56	87%	



**PHYSICAL TARGETS & ACHIVEMENT UNDER BUNDELKHAND SPECIAL PACKAGE AS  
ON JUNE 2015 (MGNREGA)**

<b>STOP DAM (FIRST PHASE)</b>					
<b>S.No.</b>	<b>Scheme/District</b>	<b>Target</b>	<b>Completed</b>	<b>Ongoing</b>	<b>Remark</b>
1	Sagar	84	77	7	
2	Chhatarpur	86	84	2	
3	Damoh	53	53	0	
4	Tikamgarh	67	60	5	02 Stop dams cancelled
5	Panna	35	34	1	
6	Datia	28	24	3	
	<b>Total</b>	<b>353</b>	<b>332</b>	<b>18</b>	
<b>PUMP SETS / LIFTING DEVICE (FIRST PHASE)</b>					
<b>S.No.</b>	<b>Scheme/District</b>	<b>Target</b>	<b>IDENTIFIED BENIFICIERIS</b>	<b>PUMP INSTALLED</b>	<b>Remark</b>
1	Sagar	6568	6568	6568	
2	Chhatarpur	9081	9081	9081	
3	Damoh	8223	8223	8223	
4	Tikamgarh	8754	7915	7900	
5	Panna	6974	6698	6003	
6	Datia	400	400	400	
	<b>Total</b>	<b>40000</b>	<b>38885</b>	<b>38175</b>	
<b>PUMP SETS / LIFTING DEVICE (SECOND PHASE)</b>					
<b>S.No.</b>	<b>Scheme/District</b>	<b>Target</b>	<b>IDENTIFIED BENIFICIERIS</b>	<b>PUMP INSTALLED</b>	<b>Remark</b>
1	Sagar	1417	1339	563	process of installing pump sets is on progress
2	Chhatarpur	2820	1188	916	
3	Damoh	1906	530	60	
4	Tikamgarh	1939	0	0	
5	Panna	1618	0	0	
6	Datia	300	66	0	
	<b>Total</b>	<b>10000</b>	<b>3123</b>	<b>1539</b>	

<b>Financial &amp; Physical Targets and Achievement as on JUNE 2015 (MGNREGA) (Second phase)</b>					
<b>S.No.</b>	<b>Scheme/District</b>	<b>Financial (Rs. In Cr.)</b>		<b>Physical (No.)</b>	
		<b>Target</b>	<b>Actual</b>	<b>Target</b>	<b>Achievement</b>
<b>II</b>	<b>Pump Sets / Lifting Device</b>				
1	Sagar	3.54	1.55	1417	563
2	Chhatarpur	7.05	2.67	2820	916
3	Damoh	4.77	0.82	1906	60
4	Tikamgarh	4.85	0.00	1939	0
5	Panna	4.05	0.00	1618	0
6	Datia	0.75	0.00	300	0
	<b>Total</b>	<b>25.00</b>	<b>5.03</b>	<b>10000</b>	<b>1539</b>

**Financial & Physical Targets and Achievement as on JUNE 2015 (MGNREGA)  
(First phase)**

S.No.	Scheme/District	Financial (Rs. In Cr.)		Physical (No.)	
		Target	Actual	Target	Achievement
<b>I</b>	<b>Stop Dam</b>				
1	Sagar	40.17	31.92	84	77
2	Chhatarpur	24.27	20.96	86	84
3	Damoh	18.55	16.91	53	53
4	Tikamgarh	20.88	15.97	67	60
5	Panna	15.78	12.10	35	34
6	Datia	10.35	8.91	28	24
<b>Total</b>		<b>130.00</b>	<b>106.77</b>	<b>353</b>	<b>332</b>
<b>II</b>	<b>Pump Sets / Lifting Device</b>				
1	Sagar	13.14	13.14	6568	6568
2	Chhatarpur	18.16	17.93	9081	9081
3	Damoh	16.45	16.15	8223	8223
4	Tikamgarh	17.51	15.81	8754	7900
5	Panna	13.95	12.03	6974	6003
6	Datia	0.80	0.73	400	400
<b>Total</b>		<b>80.00</b>	<b>75.79</b>	<b>40000</b>	<b>38175</b>
<b>III</b>	<b>Dug Wells</b>				
1	Sagar		163.28	9996	7779
2	Chhatarpur		206.15	14717	11453
3	Damoh		139.66	10942	8758
4	Tikamgarh		124.66	8651	7978
5	Panna		118.90	8201	7172
6	Datia		5.44	1220	546
<b>Total</b>			<b>758.11</b>	<b>53727</b>	<b>43686</b>
<b>IV</b>	<b>Khet Talab</b>				
1	Sagar		2.27	992	472
2	Chhatarpur		1.72	2427	748
3	Damoh		5.26	566	554
4	Tikamgarh		1.30	877	872
5	Panna		0.00	0	0
6	Datia		0.00	0	0
<b>Total</b>			<b>10.56</b>	<b>4862</b>	<b>2646</b>
<b>V</b>	<b>Renovation and Recharging of Dug Wells</b>				
1	Sagar		6.21	842	641
2	Chhatarpur		10.50	210	170
3	Damoh		32.31	1098	816
4	Tikamgarh		12.18	525	466
5	Panna		14.12	710	384
6	Datia		0.23	225	82
<b>Total</b>			<b>75.55</b>	<b>3610</b>	<b>2559</b>
