


मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज

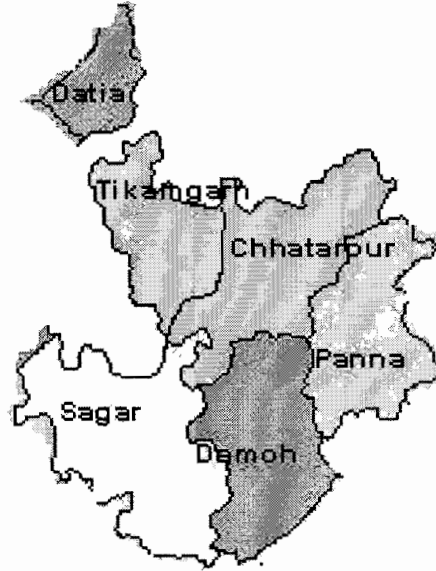

विद्युत/डीजल पम्प सेट प्रदाय एवं स्टाप डेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

माह फरवरी 2014

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज प्रथम चरण

कपिल धारा कूओं पर विद्युत/डीजल पम्प प्रदाय

- ✓ कुल प्रावधानित राशि रू. 80 करोड़
- ✓ जिलों को प्रदाय राशि रू. 80 करोड़
- ✓ भौतिक लक्ष्य संख्या – 40,000
- ✓ पूर्ण कूपों की संख्या – **37288** (महात्मा गांधी नरेगा कपिलधारा उपयोजनान्तर्गत)
- ✓ कुल स्थापित पम्पों की संख्या – **31584**
- ✓ पम्पसेट प्रदाय हेतु चिन्हित हितग्राहियों की संख्या – **35303**
- ✓ व्यय राशि रू. **61.50** करोड़

नदी नालों पर श्रंखलाबद्ध स्टाप डेम- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

- ✓ कुल प्रावधानित राशि रू. 130 करोड़
- ✓ जिलों को प्रदाय राशि रू 130 करोड़
- ✓ स्टाप डेम की संख्या – 353
- ✓ प्रगतिरत स्टाप डेम की संख्या- 120

(08 अप्रारंभ (छतरपुर 05, टीकमगढ 03), 35 स्टाप डेम फाऊंडेशन लेवल एवं,

85 स्टाप डेम सुपर स्ट्रकचर लेवल)

- ✓ पूर्ण स्टाप डेम की संख्या – 225
- ✓ कुल व्यय राशि रू. 77.69 करोड़

पम्पसेट प्रदाय एवं स्टापडेम निर्माण की अद्यतन वित्तीय प्रगति

क्र	विवरण	स्वीकृत राशि	ACA से प्राप्त (राशि करोड में)			जिलों को प्रदाय राशि	व्यय	प्रतिशत
			I	II	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पम्प सेट प्रदाय	80.00	45.00	35.00	80.00	080.00	61.50	77%
2	स्टापडेम निर्माण	130.00	26.40	103.60	130.00	130.00	77.69	60%
	योग	210.00	71.40	138.60	210.00	210.00	139.19	66%

Financial & Physical Targets and Achievement as on February 2014 (MGNREGA)

S.No.	Scheme/District	Financial (Rs. In Cr.)		Physical (No.)	
		Target	Actual	Target	Achievement
I	Stop Dam				
1	Sagar	40.17	23.61	85	57
2	Chhatarpur	24.27	14.16	86	63
3	Damoh	18.55	15.72	53	51
4	Tikamgarh	20.88	9.66	66	33
5	Panna	15.78	9.87	35	16
6	Datia	10.35	4.67	28	5
	Total	130.00	77.69	353	225
II	Pump Sets / Lifting Device				
1	Sagar	12.34	10.37	6168	5217
2	Chhatarpur	18.16	13.94	9081	6993
3	Damoh	16.45	13.91	8223	7451
4	Tikamgarh	16.71	13.53	8354	6764
5	Panna	13.95	9.19	6974	4854
6	Datia	2.40	0.56	1200	305
	Total	80.00	61.50	40000	31584
III	Dug Wells				
1	Sagar		134.31	6168	6052
2	Chhatarpur		175.16	9081	9890
3	Damoh		115.34	8223	7876
4	Tikamgarh		94.44	8354	6813
5	Panna		92.71	6974	6199
6	Datia		4.67	1200	458
	Total	0	616.62	40000	37288
IV	Khet Talab				
1	Sagar		2.27	992	472
2	Chhatarpur		1.72	2427	748
3	Damoh		1.76	566	185
4	Tikamgarh		1.30	877	872
5	Panna		0.00	0	0
6	Datia		0.00	0	0
	Total	0	7.05	4862	2277
V	Renovation and Recharging of Dug Wells				
1	Sagar		6.21	842	641
2	Chhatarpur		10.50	210	170
3	Damoh		20.16	1098	509
4	Tikamgarh		12.18	525	466
5	Panna		14.12	710	384
6	Datia		0.23	225	82
	Total	0	63.40	3610	2252

बुन्देलखण्ड पैकेज के तहत वाटरशेड विकास परियोजनाओं की स्थिति

- 6 जिलों नामतः सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना एवं दतिया में 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उपचार हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना आई.डब्ल्यू.एम.पी. के अंतर्गत रुपये 480 करोड़ की 70 परियोजनाओं की स्वीकृत की गई हैं।
- वर्ष 2009–10 में 13 परियोजनायें, 2010–11 में 28 परियोजनायें तथा 2011–12 में 29 परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं, जिनकी परियोजना अवधि स्वीकृति वर्ष से 5 – 7 वर्ष की है।
- स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत रुपये वर्ष 2009– 10 से अभी तक 101.26 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार तथा राज्य शासन से प्राप्त हुई है जिसके विरुद्ध 67.38 करोड़ का व्यय किया गया है।
- स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत आस्थामूलक मद में 578 कार्य और जल संरक्षण मद में 668 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण हुआ है।
- स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत 4706 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार हुआ है।
- स्वीकृत परियोजनाओं के अंतर्गत कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के कार्यों के फलस्वरूप उत्पादकता में 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
