



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारण्टी परिषद्
(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक. 2479 /NR-3/Bundelkhand/MGNREGS/2016

भोपाल, दि. 29/08/2016

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
भोपाल

विषय :- बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज की जानकारी के संबंध में।

विषयांतर्गत बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्राप्त राशि से पम्प सेट का प्रदाय एवं स्टापडेम निर्माण की माह जून 2016 अंत तक की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(रघुराज राजेन्द्रन)
आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,भोपाल

पृ.क्रमांक. 2480 /NR-3/Bundelkhand/MGNREGS/2016
प्रतिलिपि,


भोपाल, दि. 29/08/2016

1. प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग, म.प्र. विंध्याचल भवन, प्रथम तल, भोपाल।
2. सचिव, मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विंध्याचल भवन, द्वितीय तल, भोपाल।
3. संयुक्त आयुक्त वित्त एवं लेखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. श्रीमती प्रीति तिवारी प्रबंधक आई.टी. की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

आयुक्त

म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद्,भोपाल

बुन्देलखण्ड पैकेज

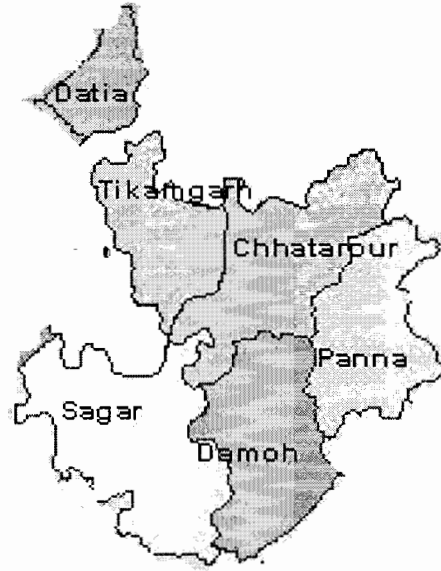

विद्युत/डीजल पम्प सेट प्रदाय एवं स्टाप डेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

माह जून 2016

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण (ACA मद)

कपिल धारा कूओं पर विद्युत/डीजल'पम्प प्रदाय

| विवरण | प्रथम चरण | द्वितीय चरण (2013-14 से 2016-17 तक) |
|--|-----------------|--|
| कुल प्रावधानित राशि | रु. 80.00 करोड़ | रु. 25.00 करोड़ |
| कुल प्राप्त राशि | रु. 80.00 करोड़ | रु. 25.00 करोड़ |
| जिलों को प्रदाय राशि | रु. 80.00 करोड़ | रु. 4.15 करोड़ |
| व्यय राशि | रु. 78.03 करोड़ | रु. 7.70 करोड़ |
| भौतिक लक्ष्य संख्या | 40,000 | 10,000 |
| पम्पसेट प्रदाय हेतु चिन्हित हितग्राहियों की संख्या | 39,387 | 3658 |
| पम्पसेट प्रदाय हेतु जारी कार्यादेश की संख्या | 39,387 | 3438 |
| कुल स्थापित पम्पों की संख्या | 39,109 | 2925 |

नदी नालों पर श्रंखलाबद्ध स्टाप डेम— ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

- ✓ कुल प्रावधानित राशि रु. 130 करोड़
- ✓ जिलों को प्रदाय राशि रु 130 करोड़
- ✓ स्वीकृत स्टाप डेम की संख्या – 353
- ✓ पूर्ण स्टाप डेम की संख्या – 348
- ✓ प्रगतिरत स्टाप डेम की संख्या—02 (दोनो सुपर स्ट्रकचर लेवल पर)
- ✓ निरस्त स्टाप डेम की संख्या— 03 (टीकमगढ जिले के 02 एवं दतिया जिले का 01 स्टापडेम निरस्त f जा चुके है)
- ✓ कुल व्यय राशि रु. 114.91 करोड़

प्रथम चरण

पम्पसेट प्रदाय एवं स्टापडेम निर्माण की अद्यतन वित्तीय प्रगति (राशि करोड में)

| क्र | विवरण | स्वीकृत राशि | ACA से प्राप्त | | | जिलों को प्रदाय राशि | व्यय | प्रतिशत | उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि |
|-----|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|------------|------------------------------|
| | | | I | II | Total | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | पम्प सेट प्रदाय | 80.00 | 45.00 | 35.00 | 80.00 | 80.00 | 78.03 | 98 % | 77.88 |
| 2 | स्टापडेम निर्माण | 130.00 | 26.40 | 103.60 | 130.00 | 130.00 | 114.91 | 88% | 113.96 |
| | योग | 210.00 | 71.40 | 138.60 | 210.00 | 210.00 | 192.94 | 92% | 191.84 |

द्वितीय चरण

पम्पसेट प्रदाय की अद्यतन वित्तीय प्रगति (राशि करोड में)

| क्र | विवरण | स्वीकृत राशि | ACA से प्राप्त राशि | | | जिलों को प्रदाय राशि | व्यय | प्रतिशत | उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि |
|-----|-----------------|--------------|---------------------|-------|-------|----------------------|------|---------|------------------------------|
| | | | I | II | Total | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | पम्प सेट प्रदाय | 25.00 | 4.15 | 20.85 | 25.00 | 4.15 | 7.70 | 31% | 6.13 |

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत
ACA मद से
पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (प्रथम चरण)

माह जून 2016 की स्थिति में

प्रपत्र 01

| क्रमांक | जिले का नाम | भौतिक प्रगति | | | | | वित्तीय प्रगति | | |
|------------|-------------|--------------|-------------------|---|-------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|---|
| | | भौतिक लक्ष्य | चिह्नित हितग्राही | पम्प प्रतिस्थापना हेतु जारी आदेश (हितग्राहियों की संख्या) | स्थापित पंपों की संख्या | लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पंपों की संख्या | वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़ में) | जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड़ में) | पम्प सेट हेतु विमुक्त अनुदान की राशि (रु.करोड़ में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | सागर | 6568 | 6568 | 6568 | 6568 | 0 | 13.1360 | 13.1360 | 13.1360 |
| 2 | छतरपुर | 9081 | 9081 | 9081 | 9081 | 0 | 18.1620 | 18.1620 | 18.1345 |
| 3 | दमोह | 8223 | 8223 | 8223 | 8223 | 0 | 16.4460 | 16.4460 | 16.3194 |
| 4 | टीकमगढ़ | 8754 | 8141 | 8141 | 8141 | 613 | 17.5080 | 17.5080 | 16.2820 |
| 5 | पन्ना | 6974 | 6974 | 6974 | 6696 | 278 | 13.9480 | 13.9480 | 13.3814 |
| 6 | दतिया | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0.8000 | 0.8000 | 0.7815 |
| योग | | 40000 | 39387 | 39387 | 39109 | 891 | 80.0000 | 80.0000 | 78.0348 |

नोट :- 1. प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति के उपरांत ही द्वितीय चरण हेतु पम्प सेट प्रदाय करने की कार्यवाही की जाना है।

2. दमोह, छतरपुर, सागर एवं दतिया जिलों में प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति उपरांत, द्वितीय चरण हेतु हितग्राही चिह्नित करते हुए प्रथम किश्त भी जारी की गई है

प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत ACA मद से स्टापडेम निर्माण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (प्रथम चरण)

माह जून 2016 की स्थिति में

प्रपत्र - 02

| क्र. | जिला | वित्तीय प्रगति | | | भौतिक प्रगति | | | | | | | |
|------|---------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|---------------------|-----|
| | | वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़) | जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड़) | व्यय राशि (रु.करोड़) | भौतिक लक्ष्य | स्वीकृत कार्यों की संख्या | प्रगतिरत कार्यों की संख्या | पूर्ण कार्यों की संख्या | अप्रारंभ कार्यों की संख्या | प्रगतिरत कार्य | | |
| | | | | | | | | | | फाऊंडेशन लेवल | सुपर स्ट्रक्चर लेवल | योग |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | सागर | 40.17 | 40.17 | 34.91 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | छतरपुर | 24.27 | 24.27 | 21.86 | 86 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | दमोह | 18.55 | 18.55 | 17.09 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | टीकमगढ़ | 20.88 | 20.88 | 18.68 | 67 | 67 | 1 | 64 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | पन्ना | 15.78 | 15.78 | 12.47 | 35 | 35 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | दतिया | 10.35 | 10.35 | 9.90 | 28 | 28 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | महायोग | 130.00 | 130.00 | 114.91 | 353 | 353 | 2 | 348 | 3 | 0 | 2 | 2 |

नोट - टीकमगढ़ जिले के 02 कार्य एवं दतिया जिले के 01 कार्य निरस्त किये गये हैं।

बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत

ACA मद से

पम्प सेट प्रदाय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति (द्वितीय चरण)

माह जून 2016 की स्थिति में

प्रपत्र - 03

| क्रमांक | जिले का नाम | भौतिक प्रगति | | | | | वित्तीय प्रगति | | |
|---------|-------------|--------------|-------------------|---|-------------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|---|
| | | भौतिक लक्ष्य | चिह्नित हितग्राही | ऐसे हितग्राहियों की संख्या जिनके लिए प्रथम किश्त हेतु 60 % की राशि जारी की गई | स्थापित पंपों की संख्या | लक्ष्य पूर्ति हेतु शेष पंपों की संख्या | वित्तीय लक्ष्य (रु.करोड़ में) | जिले को प्रदाय राशि (रु.करोड़ में) | पम्प सेट हेतु विमुक्त अनुदान की राशि (रु.करोड़ में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | सागर | 1417 | 1417 | 1417 | 1092 | 325 | 3.5425 | 1.5450 | 2.8197 |
| 2 | छतरपुर | 2820 | 1503 | 1327 | 1279 | 1541 | 7.0500 | 1.8025 | 3.4938 |
| 3 | दमोह | 1906 | 663 | 663 | 554 | 1352 | 4.7650 | 0.7500 | 1.3372 |
| 4 | टीकमगढ़ | 1939 | 0 | 0 | 0 | 1939 | 4.8475 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | पन्ना | 1618 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 4.0450 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | दतिया | 300 | 75 | 31 | 0 | 300 | 0.7500 | 0.0525 | 0.0465 |
| योग | | 10000 | 3658 | 3438 | 2925 | 7075 | 25.0000 | 4.1500 | 7.6972 |

नोट :- 1. प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति के उपरांत ही द्वितीय चरण हेतु पम्प सेट प्रदाय करने की कार्यवाही की जाना है।

2. दमोह, छतरपुर, सागर एवं दतिया जिलों में प्रथम चरण के लक्ष्य पूर्ति उपरांत, द्वितीय चरण हेतु हितग्राही चिह्नित करते हुए प्रथम किश्त भी जारी की गई है।

3. टीकमगढ़ एवं पन्ना जिले में प्रथम चरण के लक्ष्य की पूर्ति न होने के कारण द्वितीय चरण की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई है।

MGNREGS अंतर्गत सम्पन्न कार्य (प्रथम चरण)

माह जून 2016 की स्थिति में

प्रपत्र -04

| क्र. | जिले का नाम | स्वीकृत कार्यों का विवरण | | | पूर्ण कार्यों का विवरण | | | | | | |
|---------------|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---|--|---------------------------|--|---------------|
| | | कुँआ | खेत तालाब | जल संवर्द्धन के कार्य | पूर्ण कार्यों की संख्या | | | पूर्ण कार्यों पर व्यय राशि (करोड़ में) | | | |
| | | | | | कुँआ | खेत तालाब | जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पुर्नजीवन, पुर्नभरण इत्यादि जैसे - लघु तालाब व माईनर नहरों का रखरखाव, जल पुनर्भरण, तालाबों का गहरीकरण व जीर्णोद्धार (गाद निकालने सहित)। | कुँआ | खेत तालाब | जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, पुर्नजीवन, पुर्नभरण इत्यादि जैसे - लघु तालाब व माईनर नहरों का रखरखाव, जल पुनर्भरण, तालाबों का गहरीकरण व जीर्णोद्धार (गाद निकालने सहित) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | सागर | 10049 | 1017 | 950 | 8355 | 472 | 641 | 172.19 | 2.32 | 6.23 | |
| 2 | छतरपुर | 14880 | 2427 | 210 | 11752 | 748 | 170 | 206.15 | 1.72 | 10.50 | |
| 3 | दमोह | 11142 | 566 | 1098 | 9288 | 566 | 816 | 145.57 | 5.37 | 32.31 | |
| 4 | टीकमगढ़ | 9434 | 877 | 525 | 8110 | 872 | 466 | 127.76 | 1.30 | 12.18 | |
| 5 | पन्ना | 9278 | 0 | 710 | 7479 | 0 | 384 | 124.63 | 0.00 | 14.12 | |
| 6 | दतिया | 1220 | 0 | 225 | 964 | 0 | 82 | 16.95 | 0.00 | 0.23 | |
| महायोग | | 53727 | 4862 | 3610 | 45948 | 2658 | 2559 | 793.25 | 10.71 | 75.57 | |
| | | | | | | | | | कुल व्यय राशि (करोड़ में) | | 879.54 |

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज अंतर्गत व्यय का विवरण पम्पसेट एवं स्टापडेम (प्रथम चरण)

माह जून 2016 की स्थिति में

| क्रमांक | जिले का नाम | वित्तीय लक्ष्य (रु. करोड़ में) | | | जिले को प्रदाय राशि (रु. करोड़ में) | | | व्यय राशि (रु. करोड़ में) | | | लक्ष्य v/s व्यय का प्रतिशत | | |
|------------|-------------|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------|------------|
| | | पम्पसेट | स्टापडेम | योग | पम्पसेट | स्टापडेम | योग | पम्पसेट | स्टापडेम | योग | पम्पसेट | स्टापडेम | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | सागर | 13.14 | 40.17 | 53.31 | 13.14 | 40.17 | 53.31 | 13.14 | 34.91 | 48.05 | 100% | 87% | 90% |
| 2 | छतरपुर | 18.16 | 24.27 | 42.43 | 18.16 | 24.27 | 42.43 | 18.13 | 21.86 | 39.99 | 100% | 90% | 94% |
| 3 | दमोह | 16.45 | 18.55 | 35.00 | 16.45 | 18.55 | 35.00 | 16.32 | 17.09 | 33.41 | 99% | 92% | 95% |
| 4 | टीकमगढ़ | 17.51 | 20.88 | 38.39 | 17.51 | 20.88 | 38.39 | 16.28 | 18.68 | 34.96 | 93% | 89% | 91% |
| 5 | पन्ना | 13.95 | 15.78 | 29.73 | 13.95 | 15.78 | 29.73 | 13.38 | 12.47 | 25.85 | 96% | 79% | 87% |
| 6 | दतिया | 0.80 | 10.35 | 11.15 | 0.80 | 10.35 | 11.15 | 0.78 | 9.90 | 10.68 | 98% | 96% | 96% |
| योग | | 80.00 | 130.00 | 210.00 | 80.00 | 130.00 | 210.00 | 78.03 | 114.91 | 192.94 | 98% | 88% | 92% |

| क्र. | आबंटन | जारी राशि | व्यय राशि | व्यय का प्रतिशत |
|------|---|----------------|---------------|-----------------|
| 1. | अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्राप्त कुल राशि | 210.000 | 192.94 | 92% |
| 2. | राज्य सरकार की ओर से जारी राशि | 0 | - | - |
| | कुल प्रदाय राशि | 210.000 | 192.94 | 92% |

**Allocation, Released and Expenditure of funds from ACA,CS/CSS, MGNREGA
components to MP (June 2016) (Rs. In Cr.) II Phase**

| S N. | Department | Approved Budget | Additional central Assistance | | | CS/CSS Schemes | | | MGNREGA | | | UC |
|------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|-------------|----------------|----------|--------|------------|----------|--------|-------------|
| | | | Alloca tion | Relea sed | Actual | Allocation | Released | Actual | Allocation | Released | Actual | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Rural development | | | | | | | | | | | |
| i) | Supply of pump sets | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 6.73 | - | - | - | - | - | - | 6.13 |
| | Total | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 6.73 | - | - | - | - | - | - | 6.13 |

Bundelkhand special package financial progress up to Jun2016

Name of Department

Rural Development

phase I, 2012-13

| Sl.no. | Name of project/scheme | Total Project cost | Approved ACA | Allocation | Released Up to june 2016 | Expenditure till june 2016 | % of Expenditure | UC sent to GoI till june 2016 |
|--------|------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Stop dam | 130 | 130 | 130 | 130 | 114.91 | 88% | 113.96 |
| 2 | Supply of Pump sets | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 78.03 | 98% | 77.88 |

phase I, 2013-14

| Sl.no. | Name of project/scheme | Total Project cost | Approved ACA | Allocation | Released Up to june 2016 | Expenditure till june 2016 | % of Expenditure | UC sent to GoI till june 2016 |
|--------|------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |

phase II, 2013-14

| Sl.no. | Name of project/scheme | Total Project cost | Approved ACA | Allocation | Released Up to june 2016 | Expenditure till june 2016 | % of Expenditure | UC sent to GoI till june 2016 |
|--------|------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | Supply of Pump sets | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 7.70 | 31% | 6.13 |

| ACA- Phase -1 2012-13 (As on 30.06. 2016) (Rs. In Cr.) | | | |
|--|-------------------|-----------------|--------------------|
| Department | Allocation | Released | Expenditure |
| Rural development (Stop dam & pump set) | 210.00 | 210.00 | 192.94 |
| ACA- Phase -I 2013-14 (As on 30.06. 2016) (Rs. In Cr.) | | | |
| Department | Allocation | Released | Expenditure |
| Rural development | - | - | - |
| ACA- Phase -II 2014-15 (As on 30.06. 2016) (Rs. In Cr.) | | | |
| Department | Allocation | Released | Expenditure |
| Rural development (Stop dam & pump set) | 25 | 25 | 7.70 |

**PHYSICAL TARGETS & ACHIVEMENT UNDER BUNDELKHAND SPECIAL PACKAGE AS
ON June 2016 (MGNREGA)**

| STOP DAM (FIRST PHASE) | | | | | |
|--|------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| S.No. | Scheme/District | Target | Completed | Ongoing | Remark |
| 1 | Sagar | 84 | 84 | 0 | |
| 2 | Chhatarpur | 86 | 86 | 0 | |
| 3 | Damoh | 53 | 53 | 0 | |
| 4 | Tikamgarh | 67 | 64 | 1 | 02 Stop dams cancelled |
| 5 | Panna | 35 | 34 | 1 | |
| 6 | Datia | 28 | 27 | 0 | 01 Stop dam cancelled |
| | Total | 353 | 348 | 2 | |
| PUMP SETS / LIFTING DEVICE (FIRST PHASE) | | | | | |
| S.No. | Scheme/District | Target | IDENTIFIED BENIFICIERIS | PUMP INSTALLED | Remark |
| 1 | Sagar | 6568 | 6568 | 6568 | |
| 2 | Chhatarpur | 9081 | 9081 | 9081 | |
| 3 | Damoh | 8223 | 8223 | 8223 | |
| 4 | Tikamgarh | 8754 | 8141 | 8141 | |
| 5 | Panna | 6974 | 6974 | 6696 | |
| 6 | Datia | 400 | 400 | 400 | |
| | Total | 40000 | 39387 | 39109 | |
| PUMP SETS / LIFTING DEVICE (SECOND PHASE) | | | | | |
| S.No. | Scheme/District | Target | IDENTIFIED BENIFICIERIS | PUMP INSTALLED | Remark |
| 1 | Sagar | 1417 | 1417 | 1092 | process of installing pump sets is on progress |
| 2 | Chhatarpur | 2820 | 1503 | 1279 | |
| 3 | Damoh | 1906 | 663 | 554 | |
| 4 | Tikamgarh | 1939 | 0 | 0 | |
| 5 | Panna | 1618 | 0 | 0 | |
| 6 | Datia | 300 | 75 | 0 | |
| | Total | 10000 | 3658 | 2925 | |

**Financial & Physical Targets and Achievement as on June 2016 (MGNREGA)
(First phase)**

| S.No. | Scheme/District | Financial (Rs. In Cr.) | | Physical (No.) | |
|--------------|---|------------------------|---------------|----------------|--------------|
| | | Target | Actual | | Achievement |
| I | Stop Dam | | | | |
| 1 | Sagar | 40.17 | 34.91 | 84 | 84 |
| 2 | Chhatarpur | 24.27 | 21.86 | 86 | 86 |
| 3 | Damoh | 18.55 | 17.09 | 53 | 53 |
| 4 | Tikamgarh | 20.88 | 18.68 | 67 | 64 |
| 5 | Panna | 15.78 | 12.47 | 35 | 34 |
| 6 | Datia | 10.35 | 9.90 | 28 | 27 |
| Total | | 130.00 | 114.91 | 353 | 348 |
| II | Pump Sets / Lifting Device | | | | |
| 1 | Sagar | 13.14 | 13.14 | 6568 | 6568 |
| 2 | Chhatarpur | 18.16 | 18.13 | 9081 | 9081 |
| 3 | Damoh | 16.45 | 16.32 | 8223 | 8223 |
| 4 | Tikamgarh | 17.51 | 16.28 | 8754 | 8141 |
| 5 | Panna | 13.95 | 13.38 | 6974 | 6696 |
| 6 | Datia | 0.80 | 0.78 | 400 | 400 |
| Total | | 80.00 | 78.03 | 40000 | 39109 |
| III | Dug Wells | | | | |
| 1 | Sagar | 209.81 | 172.19 | 10049 | 8355 |
| 2 | Chhatarpur | 264.9 | 206.15 | 14880 | 11752 |
| 3 | Damoh | 175.13 | 145.57 | 11142 | 9288 |
| 4 | Tikamgarh | 135.17 | 127.76 | 9434 | 8110 |
| 5 | Panna | 135.95 | 124.63 | 9278 | 7479 |
| 6 | Datia | 12.15 | 16.95 | 1220 | 964 |
| Total | | 933.11 | 793.25 | 53727 | 45948 |
| IV | Khet Talab | | | | |
| 1 | Sagar | 4.77 | 2.32 | 1017 | 472 |
| 2 | Chhatarpur | 5.58 | 1.72 | 2427 | 748 |
| 3 | Damoh | 5.90 | 5.37 | 566 | 566 |
| 4 | Tikamgarh | 1.38 | 1.30 | 877 | 872 |
| 5 | Panna | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 | Datia | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Total | | 17.63 | 10.71 | 4862 | 2658 |
| V | Renovation and Recharging of Dug Wells | | | | |
| 1 | Sagar | 8.20 | 6.23 | 950 | 641 |
| 2 | Chhatarpur | 12.98 | 10.50 | 210 | 170 |
| 3 | Damoh | 43.48 | 32.31 | 1098 | 816 |
| 4 | Tikamgarh | 13.72 | 12.18 | 525 | 466 |
| 5 | Panna | 26.10 | 14.12 | 710 | 384 |
| 6 | Datia | 0.63 | 0.23 | 225 | 82 |
| Total | | 105.11 | 75.57 | 3610 | 2559 |

**Financial & Physical Targets and Achievement as on June 2016 (MGNREGA)
(Second phase)**

| S.No. | Scheme/District | Financial (Rs. In Cr.) | | Physical (No.) | |
|-------|-----------------------------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | Target | Actual | Target | Achievement |
| II | Pump Sets / Lifting Device | | | | |
| 1 | Sagar | 3.54 | 2.82 | 1417 | 1092 |
| 2 | Chhatarpur | 7.05 | 3.49 | 2820 | 1279 |
| 3 | Damoh | 4.77 | 1.34 | 1906 | 554 |
| 4 | Tikamgarh | 4.85 | 0.00 | 1939 | 0 |
| 5 | Panna | 4.05 | 0.00 | 1618 | 0 |
| 6 | Datia | 0.75 | 0.05 | 300 | 0 |
| | Total | 25.00 | 7.70 | 10000 | 2925 |
